

Gesuch für die Bewilligung von Grabarbeiten in Gemeindestrassen

Das Gesuch mit Situation ist **im Doppel** einzureichen

Bauherrschaft

Unternehmung Grabarbeiten

Unternehmung Belagsarbeiten

Strasse GS-Nr.

Zweck Länge

Baubeginn Dauer

Datum Unterschrift Bauherrschaft

Allgemeine Bedingungen

1. Die einschlägigen **Normen und Vorschriften** der VSS, des SIA und der SUVA sind strikte einzuhalten. Sie gehen anderslautenden Bestimmungen des Werkvertrages vor.
2. Es ist Sache des Bewilligungsinhabers, sich vor Inangriffnahme der Arbeiten bei den zuständigen Werken über Projekte und **bestehende Anlagen** und deren Vorschriften zu informieren.
3. Werden **bestehende Elemente** (Vermessungspunkte, Markierungen, Schlaufen, etc.) beschädigt oder entfernt, so sind diese wieder zu erstellen.
4. Wird der **Verkehr** tangiert, ist eine Bewilligung der zuständigen Verkehrspolizei einzuholen.
5. Ausbauasphalt ist gemäss der Empfehlung: **Teerhaltiger Ausbauasphalt** (BUWAL Mai 2004) zu entsorgen.
6. Bauarbeiten in **Grundwasserschutzzonen** erfordern die Zustimmung des Amtes für Umweltschutz (AfU).
7. Die vorliegende Bewilligung ist rechtzeitig vor **Baubeginn** der Bauleitung und dem Unternehmer zuzustellen.
8. Vor Beginn der Arbeiten, zur **Kontrolle** der Reinplanie und zur Schlussabnahme ist dem zuständigen Sachbearbeiter rechtzeitig **Meldung** zu erstatten. Tel: 079/643 67 36
9. Nach Abschluss der Arbeiten sind die **Planunterlagen** über das ausgeführte Werk (eingemessen), sofern das Werk nicht in einem werkseigenen Kataster geführt wird, unaufgefordert der Bauabteilung Menzingen zuzustellen.
10. Die Wiederinstandstellung des Belages hat durch eine im **Strassenbau erfahrene Unternehmung** zu erfolgen.
11. Bei schlechter Witterung, oder bei nicht Erreichen der geforderten ME-Werte, sowie bei Terminkollisionen sind auf Anordnung des zuständigen Sachbearbeiters **provisorische Beläge** einzubauen.

Folgende Werke sind für das Leitungswesen zuständig:

Kanalisation:
Einwohnergemeinde Menzingen
Pläne bei Berchtold + Eicher, Zug, anfordern

Telefon:
Swisscom AG

Elektrizität:
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
oder WWZ Energie AG

Kabelfernsehen:
Telezug AG


Wasser:
Dorfgenossenschaft Menzingen oder
Wassergenossenschaft Finstersee

Bewilligt am: _____

Ausführungsart

Provisorische Wiederherstellung in Schichten:

- Anstreichen gereinigte Fugenflanke mit Heissbitumen oder Anstrichmasse
- Einbau Tragschicht von Hand oder maschinell
- Anstreichen gereinigte Fugenflanke mit Heissbitumen oder Anstrichmasse
- Einbau Binderschicht von Hand oder maschinell bis OK fertig Belag

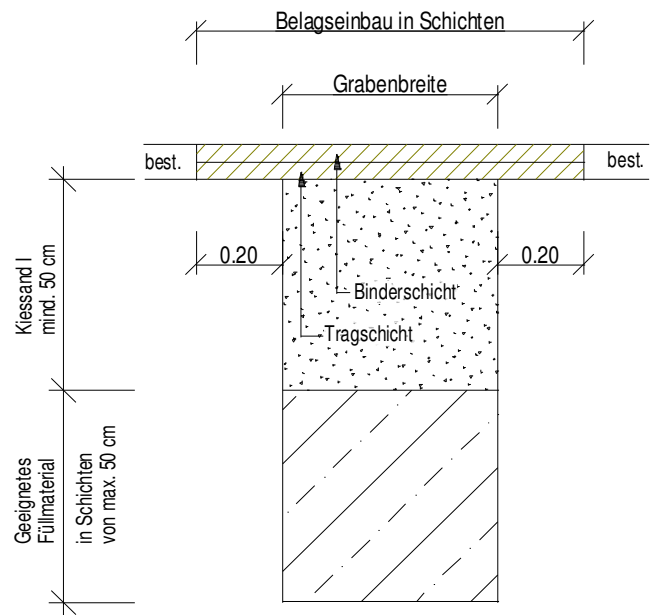

Definitive Wiederherstellung (zeitlich verschoben)

- Abfräsen überbaute Binderschicht
- Reinigen und Aufbringen Fugenband an Fugenflanke
- Einbau Deckschicht von Hand oder maschinell

